남서울대학교 캡스톤디자인 트레인팀

프로젝트 수행 계획서

목 차

- 1. 프로젝트 요약
- 2. 프로젝트 상세
 - 2.1 목 적
 - 2.2 범 위
 - 2.3 가 정
 - 2.4 제약사항
- 3. 프로젝트 조직 및 책임
 - 3.1 조직도
 - 3.2 담당업무
- 4. 개발방법론 및 산출물 정의
 - 4.1 S/W Life Cycle 및 개발방법론 선정
 - 4.2 선정 이유
 - 4.3 단계별 활동 및 산출물 정의
- 5. 마일스톤 및 일정계획
- 6. 시스템 구성
 - 6.1 구성도
 - 6.2 타 시스템과의 연관관계
- 7. 의사소통 관리

1. 프로젝트 요약

프로젝트명	SBS(Smart Book Store)		
프로젝트 설명	강의교재를 간편하게 구매할 수 있는 웹사이트		
대상 사용자	학생, 대학 서점		
	1. 교재를 구매하는데 시간이 오래 걸린다.		
필요성	2. 협소한 공간에 많은 사람이 모여 혼잡하다.		
들파잉	3. 신입생이 교재 정보를 찾는데 어려움이 있다.		
	4. 서점에서 판매할 교재 정보를 수집하는데 불편함이 있다.		
	1. 서점에서 주문해야할 교재 정보들을 제공		
	2. 판매량을 통계 정보로 제공하여 다음에 주문해야할 수량 예측 가능		
제공하는 기능	3. 수강신청한 강의의 교재를 가져와 리스트로 제공		
	4. 리스트에서 선택한 교재를 결제		
	5. 학생별 묶음 상품으로 만들 수 있도록 개인 구매 내역을 종이로 출력		
	1. 결제 과정과 교재 정보를 찾는 과정을 단축시켜 혼잡함이 줄어들고		
	학생에게 편의성을 제공할 수 있다.		
	2. 서점에서 주문해야할 교재 정보들을 제공하기 때문에 서점 직원에게		
	편의성을 제공할 수 있다.		
기대효과	3. 서점에게 판매량 통계 자료를 제공하여 다음에 주문해야할 교재		
	수량을 예측 가능하게 한다.		
	4. 학생별로 수령해야할 교재들을 묶음 상품으로 만들어 제공하기 때문		
	ОП		
	학생에게 편의성을 제공할 수 있다.		
착수일	2023/09/05		
종료일	2023/12/15		
투입인력(MM)	임세규, 강현수, 김영민, 엄태정		
비용(VAT포함)	250,000원		

2. 프로젝트 상세

2.1 목적

SBS를 통해 프로젝트 요약 - 필요성에서 언급한 불편한 점을 해결한다.

2.2 범위

업무	주기능	부기능	세부 업무 내용	
인증			학생/서점 회원 가입 기능 제공	
		회원가입	아이디, 비밀번호, 이름, 핸드폰 번호,	
	회원관리		이메일 주소, 학번/가맹점 ID	
	외전신니 	로그인	아이디와 비밀번호 대조하여 로그인	
		아이디 찾기	Email 인증을 통해 아이디 변경	
		비밀번호 찾기	Email 인증을 통해 비밀번호 변경	
	마이페이지	비밀번호 변경	현재 비밀번호 변경	
		내 정보 수정	개인정보 수정 (전화번호, 이메일)	
			웹스크래핑 기술로 LMS의 강의계획서에	
기초정보		교재명 수집	서 주교재명을 가져온다.	
기조성도 수집	교재 수집		네이버 책 검색 API를 이용하여	
T U		교재 정보 수집	가져온 주교재명을 검색 후 교재 정보를	
			XML 혹은 JSON 파일로 가져온다.	
		서점에게 전체 교재	서점에게 학과별, 교양별로 어떤 교재가	
	교재 리스트	리스트 조회	필요한지 리스트 형태로 제공	
	조회	학생에게 수강 신청한	학생이 수강신청한 강의에서 필요한	
		교재 리스트 조회	교재명을 리스트 형태로 제공	
저버ㅈ딍			학생 개인이 구매한 구매 내역을	
정보조회	구매 내역	개인 구매 내역 조회 	서점 사이트에서 조회	
	조회	전체 구매 내역 조회	서점에서 모든 학생들의 구매 내역을	
			서점 사이트에서 조회	
	통계 자료 조회	피메라 포크	학과별로 많이 팔린 교재들을 원그래프와	
		판매량 조회 	목록 형태로 판매 항목과 수량을 조회	
		사전결제	카카오페이 결제	
구매	교재 구매	교재 선택	학생이 수강신청 교재 리스트에서 구매할	
		교체 전략	교재를 선택	
수령	수령 정보	4 3 1 I TI HIOL (4 TI	서점에서 교재를 수령할 수 있는 날짜의	
		수령 날짜 범위 설정	범위를 설정	
		수령 날짜 선택	학생들이 교재를 수령할 날짜를 범위	
		구영 말싸 신역	내에서 선택	
		수령 여부 변경	학생이 교재를 수령할 시 수령 여부를	
		TO MT 20	변경(미수령 -> 수령)	
		¬=	SBS에서 서비스를 제공할 때 필요한 서버	
서버	서버 관리	서버 구축 	를 구축	
		<u> </u>		

2.3 가 정

- 사용자의 인터넷 연결이 원활해야 한다.
- 대학교에 대학 서점이 있어야 한다.
- 사용자는 카카오톡 계정을 갖고 있어야 한다.

2.4 제약사항

- 사용자는 대학교에 재학중인 학생, 대학 서점 직원이어야 한다.
- 사용자들이 회원가입을 하지 않으면 웹 페이지를 이용할 수 없다.
- 회원가입과 로그인 기능에 오류가 발생하면 웹 페이지를 이용할 수 없다.
- 이메일 인증이 이루어 지지 않으면 비밀번호 찾기 기능을 이용할 수 없다.
- 변경한 비밀번호가 회원 정보 테이블에 업데이트 되지 않으면 로그인할 수 없다.
- 웹 페이지가 다운되면 전체 기능을 수행할 수 없다.
- 웹 페이지에 접속할 수 없으면 전체 기능을 사용할 수 없다.
- 프로젝트는 WBS의 일정에 맞게 수행되어야 한다.
- 프로젝트는 정해진 기간 내에 완성되어야 한다.
- 프로젝트의 업무 범위를 나누어 우선순위와 중요도, 난이도를 인지해야 한다.
- 프로젝트를 수행하는 팀원끼리 동일한 업무량을 분담해야 한다.
- 가상 LMS에 접속할 수 없으면 교재 리스트를 가져올 수 없다.
- 업로드한 데이터의 유효성을 검증해야 하고 업로드 된 데이터는 백업을 해야 한다.
- 조회 기능은 사용자의 권한에 따라 조회 가능한 데이터를 제한해야 하고 조회한 데이터는 사용자가 이해할 수 있어야 한다.
- 강의계획서가 누락되면 교재 정보 테이블에 교재 정보가 삽입되지 않는다.
- 교재 정보 데이터가 손상되면 학생들이 조회할 수 없다.
- 정보 수정은 데이터베이스의 무결성을 보장해야 한다.
- 교재 정보 테이블에 정보가 제대로 입력되어 있지 않으면 수강신청한 강의의 교재를 찾아올 수 없다.
- 교재 리스트를 출력하지 못하면 교재를 선택할 수 없다.
- 결제 기능에 오류가 발생하면 교재를 구매할 수 없다.
- 서점 페이지에서 학생들의 전체 구매 내역을 조회할 수 없으면 교재 수령이 불가능하다.
- 수령 여부를 변경하지 못하면 학생이 교재를 중복 수령할 수 있다.
- 학생들의 구매 내역을 정확하게 합산해서 통계 데이터를 만들어야 한다.
- 통계 데이터를 만들 때 정확한 교재 정보와 수량을 체크해야 한다.

2.5 자원

자원	
사용 언어	java, javascript
프론트엔드	d3js
백엔드	Node.js
RDBMS	MariaDB
운영체제	리눅스(서버), Window 10
프레임워크	스프링프레임워크
보안	스프링시큐리티
백업 수단	드롭박스

3. 프로젝트 조직 및 책임

3.1 조직도 팀장 - 임세규 개발자 - 강현수 서기 - 김영민 형상관리자 - 엄태정

3.2 담당 업무

성 명	직위	담당 업무		
임세규	팀장	업무 분석/설계, 업무 지원		
강현수	개발자	업무 분석/설계, 업무 지원		
김영민	서기	서류 작성, 업무 지원		
엄태정	형상관리자	산출물 관리, 업무 지원		

4. 마일스톤 및 일정계획

단계	활 동	프로젝트 시작	프로젝트 종료	비고
계획	프로젝트 계획 수립	23.09.04	23.09.11	
계획	착수보고	23.09.11	23.09.11	
분석	요구사항정의	23.09.12	23.10.10	
서게	개발설계	23.09.12	23.10.10	
설계	DB 설계	23.09.12	23.10.10	
	코딩	23.10.11	23.12.11	
구현	테스트계획서 작성	23.10.06	23.10.10	
	테스트케이스 작성	23.10.06	23.10.10	
시험	테스트	23.12.12	24.03.31	
	이행계획 수립	24.03.15	24.03.31	
이해	안정화	24.04.01	24.04.01	
이행	최종 검수 및 완료	24.04.09	24.04.09	

5. 개발방법론 및 산출물 정의

5.1 S/W Life Cycle 및 개발방법론 선정

폭포수 방식

5.2 선정 이유


폭포수 모델은 순차적으로 진행되기 때문에 현재 진행중인 과정을 완벽하게 마치고 다음 과정으로 넘어가야만 한다. 오랜 기간 사용된 모델이기 때문에 참고할 수 있는 사례가 많으며 각 진행 단계 별 산출물이 명확하기 때문에 필요한 요소가 무엇인지 이해하기 적당하다고 판단되어 선정함.

5.3 단계별 활동 및 산출물 정의

단계	활 동	제 출 산 출 물	
계획	프로젝트 수행계획 수립	■ 프로젝트수행계획서	
		• WBS	
	현 업무 프로세스 분석 업무요구사항 정의	■ 요구사항분석서	
분석		■ ERD(논리)	
		• 주제관련 벤치마킹 보고서	
		■ 메뉴구조도	
		화면목록	
		■ 화면설계서	
		• 시스템구조설계서	
설계	프로그램 설계	■ 테이블목록	
2711	프도그담 될게	■ 테이블기술서	
		• ERD	
		■ 프로그램목록	
		■ 플로우차트	
		■ 스토리보드	
	코딩	SOURCE PGM	
구현	테스트계획 수립	■ 테스트 계획서	
	테스트케이스 작성	■ 테스트 케이스	
	테스트 수행	■ 테스트 결과서	
시험		■ 테스트결함 및 조치결과서	
	이행계획 수립	■ 이행 계획서	
		■ 사용자 매뉴얼	
완료		■ 완료 보고서	
	완료 보고	■ 검수 확인서	
		■ 품질보증 활동 보고서	

6. 시스템 구성

6.1 구성도

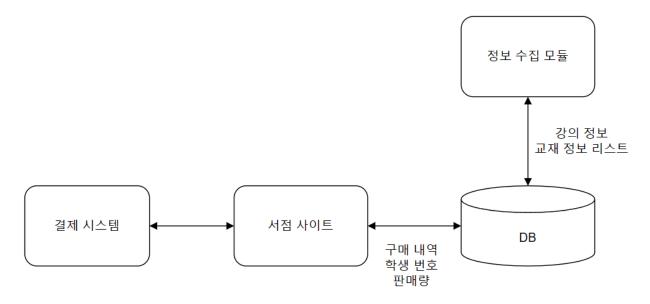

6.2 타 시스템과의 연관 관계

6.2.1 DB → 서점 사이트

학생 계정 로그인 시 다음과 같은 기능을 제공한다.

- 마이 페이지에서 개인정보 수정
- 학생 개인이 구매한 구매 내역을 조회
- 내가 결제한 교재들을 수령할 날짜를 서점이 설정한 날짜 범위 내에서 선택
- 수강신청한 강의의 교재 정보 리스트를 조회, 구매할 교재를 선택하여 서점 페이지에서 결제

서점 계정 로그인 시 다음과 같은 기능을 제공한다.

- 학생이 교재를 수령할 시 수령 여부 변경
- 서점에서 학생들이 교재를 수령할 날짜의 범위를 설정
- 전체 구매 내역과 학생 번호를 대조하여 일치하는 구매 내역을 모니터에 출력
- 학과별로 많이 팔린 교재들을 원그래프와 목록 형태로 판매 항목과 인기도를 조회

6.2.2 서점 사이트 → DB

- 전체 구매 내역 조회
- 학생 구매 내역
- 통계 자료 조회
- 교재 정보
- 로그인 정보
- 회원 정보
- 내 정보 수정
- 수령 날짜 범위, 선택 정보

6.2.3 DB ↔ 정보 수집 모듈

- LMS 수강신청 페이지에서 모든 강의 계획서로부터 교재명을 가져옴
- 가져온 교재명으로 네이버 API를 통해 해당 교재의 교재 정보를 가져옴
- 교재 정보들을 리스트로 만들어 서점에게 제공
- 학생의 LMS 아이디와 비밀번호를 입력받아 학생이 수강 신청한 강의의 교재명을 웹스크래핑 하여 가져온 교재명을 DB의 전체 교제 테이블과 비교 후 일치하는 교재 정보만을 결제 페이지에 출력

7. 의사소통관리

보고형태	주기	방법	참석대상	보고서명
착수보고	프로젝트시작 시	착수보고회	유용환, 강현수, 김영민,	프로젝트 수행계획서
			엄태정, 임세규	(WBS포함)
주간보고	주간	회의	유용환, 변회균, 강현수,	주간보고서
			김영민, 엄태정, 임세규	
완료보고	프로젝트완료 시	문서	유용환, 강현수, 김영민,	프로젝트완료보고서
			엄태정, 임세규	
